



छत्रदेव गाँउपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
छत्रगंज-अर्घाखाँची

आ.व २०७७/७८ मा संचालित योजनाहरुको अनुगमन प्रतिवेदन



योजना शाखा



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : ८ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा संभार
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ८
 - (ख) स्थान टोल : अर्घातोप
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०३/१५
 - (घ) सम्पत्ता मिति :- २०७३/०९/०७
- आयोजनाको किसिम :- भवन
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना : वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा संभार भएको नापी कितामा उल्लेख भएको
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ५,९६,७९९।५६
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ५,५०,०००।
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ६३,२९९।५६
 - (घ) जम्मा लागत :- ५,९६,७९९।५७
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष गिरि प्रसाद पौडेल
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भूपराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजकुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री पुष्पराज भण्डारी	वडा सचिव	
७	श्री सागर चौधरी	अ.सब ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगाञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७७०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : देवि मन्दिर निर्माण-देविडाँडा
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. १
 - (ख) स्थान टोल चिह्निका
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०३/१३
 - (घ) सम्मौता मिति :- २०७७/०९/०२
- आयोजनाको किसिम :- भवन
- आयोजनाको विवरण -भौतिक) योजना :- मन्दिर निर्माण भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ५,३९,९९०।६४
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ५,००,०००।
 - (ग) जनसहभागिता (रकम):- ५४,९९०।६४
 - (घ) जम्मा लागत :- ५,४२,०३६।५९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरिक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने /नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : कविराज ज्ञवाली
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
६	श्री तारा वि.क	कार्यालय सहायक	
७	श्री किरण तामाङ	अ.सब-इन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ व ०३३०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : सम्पूर्ण लिफ्ट खानेपानी व्यवस्थापन
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. २
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०३/११
- स्थान टोल : बल्कोट
- सम्मौता मिति :- २०७७/०९/०६
- आयोजनाको किसिम :- खानेपानी
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- खानेपानी मर्मत भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- २,१५,७०४.५४
 - (ख) विनियोजित बजेट :- २,००,०००.००
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- २१,५५५.५६
 - (घ) जम्मा लगत २,१५,९१८.८१
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पिताम्बर भुसाल
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	वडा अध्यक्ष	Absent
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	सहायक पाँचौ	
७	श्री विशाल ओली	अ.सब ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ व ०७अ०७६ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम :- ४ न वडा कार्यालय शौचालय तथा पखाल मर्मत
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ४
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७६/०३/०२
- आयोजनाको किसिम :- शौचालय तथा पखाल मर्मत
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- शौचालय तथा पखाल मर्मत भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- ३,२४,६६८/५४
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- ३३,६६८/५४
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गनुंपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष चुरामनी पाण्डे
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

(ख) स्थान टोल : केरुडा

(घ) सम्प्रीता मिति :- २०७७/११/१६

(ख) विनियोजित बजेट :- ३,००,०००/००

(घ) जम्मा लागत :- ३,२४,५०७/८२

(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको

(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	
५	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
६	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
७	श्री पार्वती पाण्डे	सब ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ व. ०७७०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।


- आयोजनाको नाम : म्याल टुप्पा जुम्मा मस्जिद
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. १
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०३/०१
- आयोजनाको किसिम :- मस्जिद भवन
- आयोजनाको विवरण -भौतिक) योजना :- जुम्मा मस्जिद निर्माण नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ३,२३,४०७।३७
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ३,००,०००।
 - (घ) जम्मा लागत :- ३,२३,७८६।९३
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बसिर मियाँ *बसिर मियाँ*
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	<i>तुल्सी</i>
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	<i>भेषराज</i>
३	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	<i>प्रकाश</i>
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	<i>सुनिल</i>
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	<i>साजन</i>
६	श्री नारायण ज्ञवाली	वडा सचिव	<i>Absent</i>
७	श्री किरण तामाङ	अ.सब-ईन्जिनियर	<i>किरण</i>

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

म्याल दुप्पा जुम्मा मस्जिद योजना अनुगमन

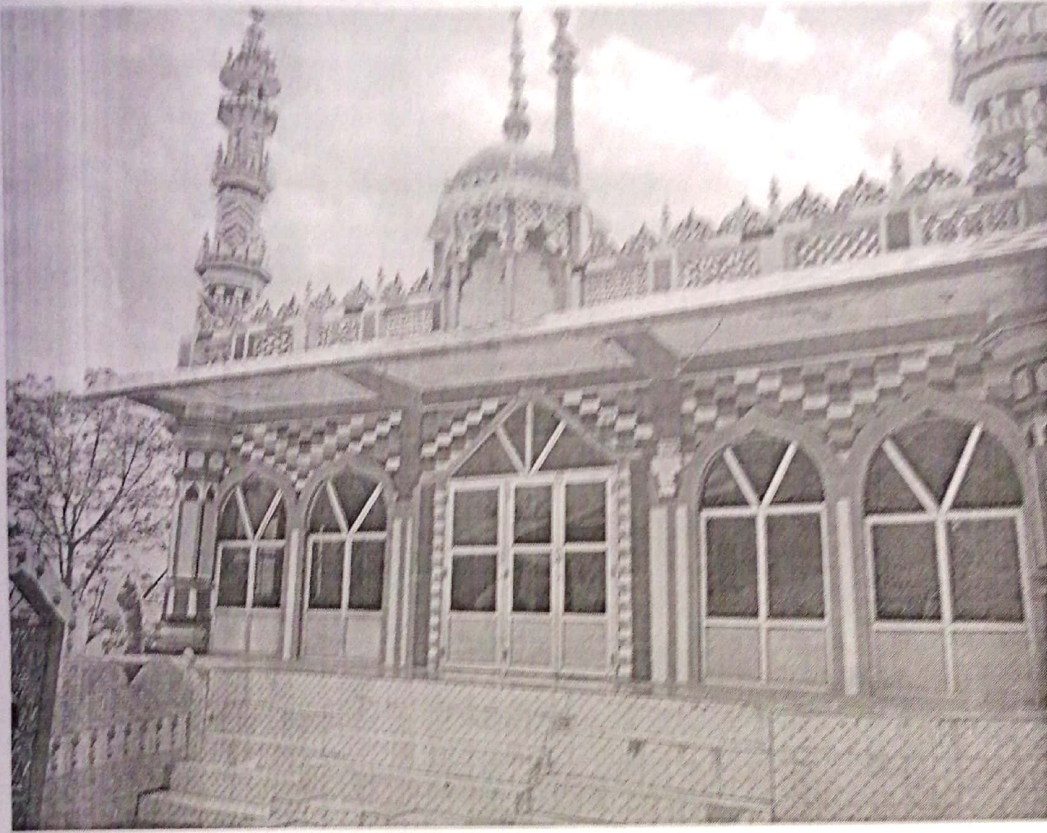



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७७/०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : ताराखसे आमा समूह भवन निर्माण
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ७
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०३/०९
(ख) स्थान टोल : भगवती
(घ) सम्पत्ती मिति :- २०७७/०९/०५
- आयोजनाको किसिम :- भवन
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- आमा समूह भवन निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,९९,५२७।८७
(ख) विनियोजित बजेट :- १,७४,६००।
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- २२,९६५।८७
(घ) जम्मा लागत :- १,९२,२५४।०४
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री शोभाखर पाण्डे	वडा अध्यक्ष	Absent
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
६	श्री उषा पाण्डे	अ.सब-इन्जिनियर	
७	श्री थानेश्वर पौडेल	वडा सचिव	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७७०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो।

- आयोजनाको नाम : तिनपिप्ले छत्रेश्वर स्कूल देखि पाटि सम्म गोरेटोबाटो निर्माण
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ५
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/२७
(ख) स्थान टोल : छत्रगञ्ज
(घ) सम्मौता मिति :- २०७७/११/०५
- आयोजनाको किसिम :- शौचालय निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- भुल्केपोखरी मन्दिरमा शौचालय निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,९५,८४९।९८
(ख) विनियोजित बजेट :- १,८०,०००।००
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- २९,२४९।७६
(घ) जम्मा लागत १,९६,२७६।२२
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरिक्षण : भएको
(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बिमला सुनार *बिमला*
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	<i>[Signature]</i>
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	<i>[Signature]</i>
३	श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	<i>[Signature]</i>
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	<i>[Signature]</i>
५	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	<i>[Signature]</i>
६	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	<i>[Signature]</i>
७	श्री शारदा रौनियार	सब इन्जिनियर	<i>[Signature]</i>

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व. ०७७/०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।



- आयोजनाको नाम : वि.पि स्मृति भवन
 - (क) आयोजना संचालन हुने बडा नं. २
 - (ख) स्थान टोल : बल्कोट
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/२२
 - (घ) सम्पत्ती मिति :- २०७७/०९/०६
- आयोजनाको किसिम :- भवन निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- वि.पि स्मृति भवन निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
- (क) लगत अनुमान रकम :- ४,३४,७०६।३६
- (ख) विनियोजित बजेट :- ४,००,०००।
- (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ४३,९९९।९९
- (घ) जम्मा लगत ४,३५,५६९।४३
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको ब्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष: तुल्लिराम पाण्डे
- अनुगमन संयोजक :- तुलसीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुलसीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	बडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री विशाल ओली	अ.सब ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

वि पि स्मृति भवन योजना अनुगमन

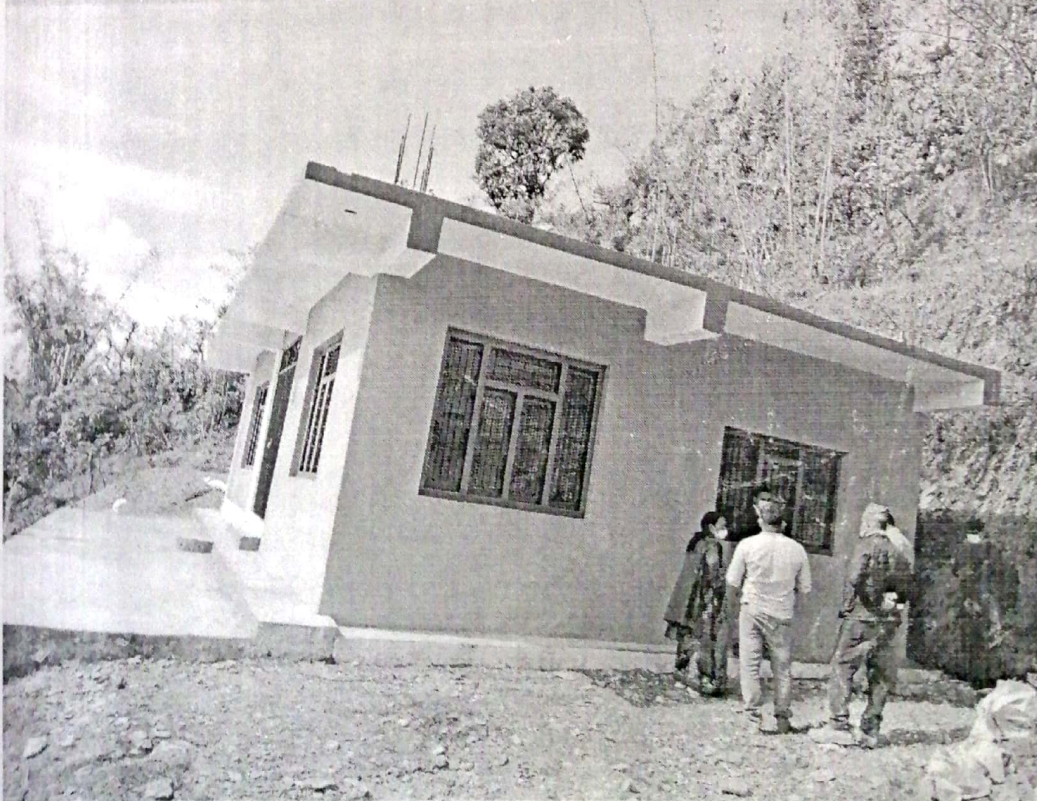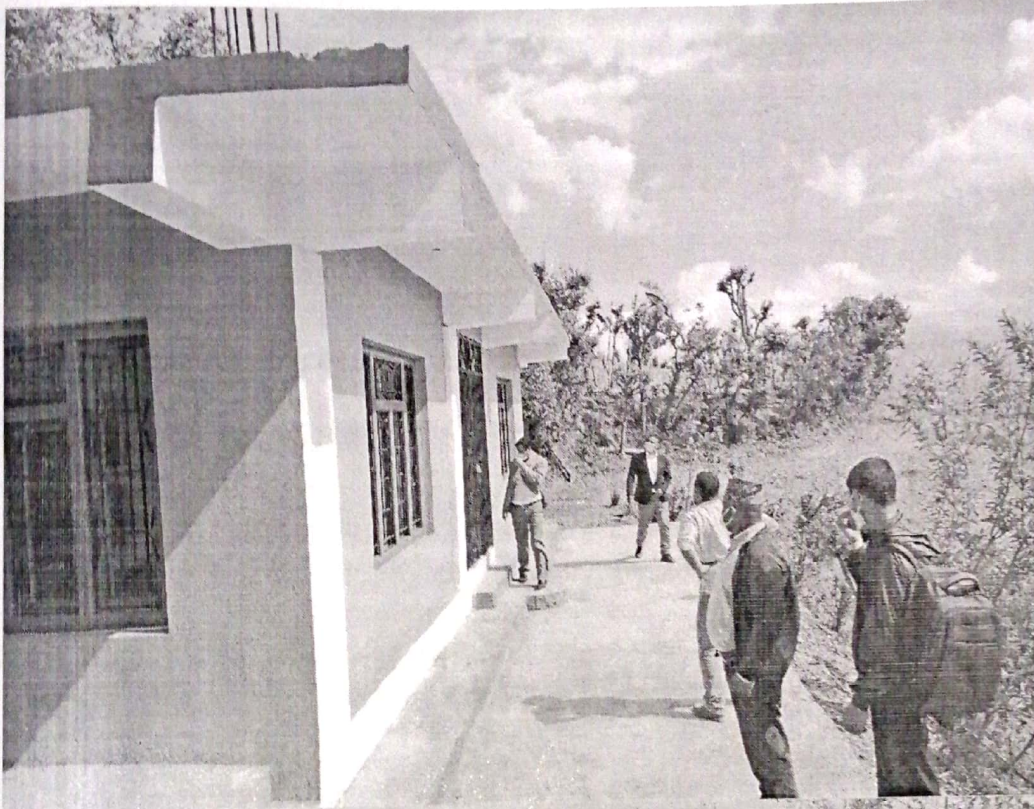



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७३०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो।

- आयोजनाको नाम : भुल्केपोखरी मन्दिरमा शौचालय निर्माण
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ५
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/२०
(ख) स्थान टोल : छत्रगञ्ज
(घ) सम्मौता मिति :- २०७७/१०/२८
- आयोजनाको किसिम :- शौचालय निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- भुल्केपोखरी मन्दिरमा शौचालय निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,०८,५८३।७६
(ख) विनियोजित बजेट :- १,००,०००।
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- ११,५८३।७६
(घ) जम्मा लागत १,०९,०७०।५३
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(ग) स्थानीय संघको अन्तर्क्रिया : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको।
- फिटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष अनन्त पन्थी
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो।



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७३०७६ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : ७ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ७
 - (ख) स्थान टोल : भगवती
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७६/०२/१९
 - (घ) सम्पत्ता मिति :- २०७७/०९/०२
- आयोजनाको किसिम :- भवन मर्मत
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- वडा कार्यालय भवन मर्मत भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ३,२४,८४६।९०
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ३,००,०००।००
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ३३,८४६।९०
 - (घ) जम्मा लगत ३,२६,२३१।२९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको ब्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- फिटानो सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने /नगर्ने) :- गर्ने
- अधिकृत अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लक्ष्मण पाण्डे *Laxman*
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	<i>(तुल्सी)</i>
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	<i>Behera</i>
३	श्री शोभाखर पाण्डे	वडा अध्यक्ष	<i>Absent</i>
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	<i>Sunil</i>
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	<i>Sajan</i>
६	श्री उषा पाण्डे	अ.सव ईन्जिनियर	<i>Usha</i>

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

७ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत योजना अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रदेव, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ व ०७३०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : बाल उद्धान स्तरोन्नति तारबार समेत
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. २
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/१८
- आयोजनाको किसिम :- पौवा निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- मन्दिर स्तरोन्नति कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- २,९६,९९१।०४
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- २२,९९१।२४
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरिक्षण : भएको
(ग) स्थानीय सगको अन्तर्क्रिया : भएको
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष: राजेन्द्र प्रसाद पौडेल
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री विशाल ओली	अ.सब ईन्जिनियर	
७	श्री हरि खनाल	प्राविधिक	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

बाल उद्धान स्तरोन्नति तारबार समेत योजना अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.ब.०७३०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : दाम्जिङ्गटार देखी फेदी सम्म मोटरबाटो निर्माण
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ५
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/१७
- आयोजनाको किसिम :- मोटरबाटो निर्माण
- आयोजनाको विवरण -भौतिक योजना :- बाल निर्माण कार्य नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,९९,६६२।८८ (ख) विनियोजित बजेट :- १,८५,०००।
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- २०,२१२।८८ (घ) जम्मा लागत :- १,९९,६६२।८८
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको ब्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दल बहादुर रायमाझी / **विष्णु प्रसाद पन्थी (सचिव)** **हस्ताक्षर**
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	
७	श्री शारदा रौनियार	सब-ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

दाब्जिङ्गटार देखी फेदी सम्म मोटरबाटो निर्माण योजना अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची
तुलसीदेवी प्रवेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७७०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित प्राविधिकहरूले स्वयंसेवक अनुगमन गर्नु पर्ने गरियो ।

- आयोजनाको नाम : सम्पूर्ण मन्दिर स्तरोन्नति
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. २
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/१५
- आयोजनाको किसिम :- पौवा निर्माण
 - (ख) स्थान टोल नक्साकोट
 - (घ) सम्मोक्षा मिति :- २०७७/०२/०५
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- मन्दिर स्तरोन्नति कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- १,०८,४४७।५७
 - (ख) विनियोजित बजेट :- १,००,०००।
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ११,४४७।५७
 - (घ) जम्मा लागत १,०८,४८६।३९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्वयंसेवक निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय सँगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष: ईन्द्रमणी न्यौपाने
- अनुगमन संयोजक :- तुलसीदेवी श्रेष्ठ

हस्ताक्षर
तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुलसीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री विशाल ओली	अ.सब ईन्जिनियर	
७	श्री हरि खनाल	प्राविधिक	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

सम्पूर्ण मन्दिर स्तरोन्नति योजना अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रदेव गाउँपालिका
सुम्बिता प्रवेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.सं. ०७७०७८ मा सो.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।


- आयोजनाको नाम : नेटा सिरार मोटरबाटो सुधार विस्तार
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ५
(ख) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/०९
(ग) स्थान टोल : भगवती
(घ) सम्मौता मिति :- २०७७/११/२१
- आयोजनाको किसिम :- मोटरबाटो
- आयोजनाको विवरण (पैतिक) योजना :- मोटरबाटो सुधार विस्तार कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,०८,११८।९५
(ख) विनियोजित बजेट :- १,००,०००।
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- ११,११८।९५
(घ) जम्मा लागत १,०९,६७०।९९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(ग) स्थानीय संघको अन्तर्क्रिया : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- फिटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छविलाल पौडेल
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री बालकृष्ण श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
६	श्री बाबुराम भट्टराई	ह.स.चा	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

नेटा सिरार मोटरबाटो सुधार विस्तार योजना अनुगमन

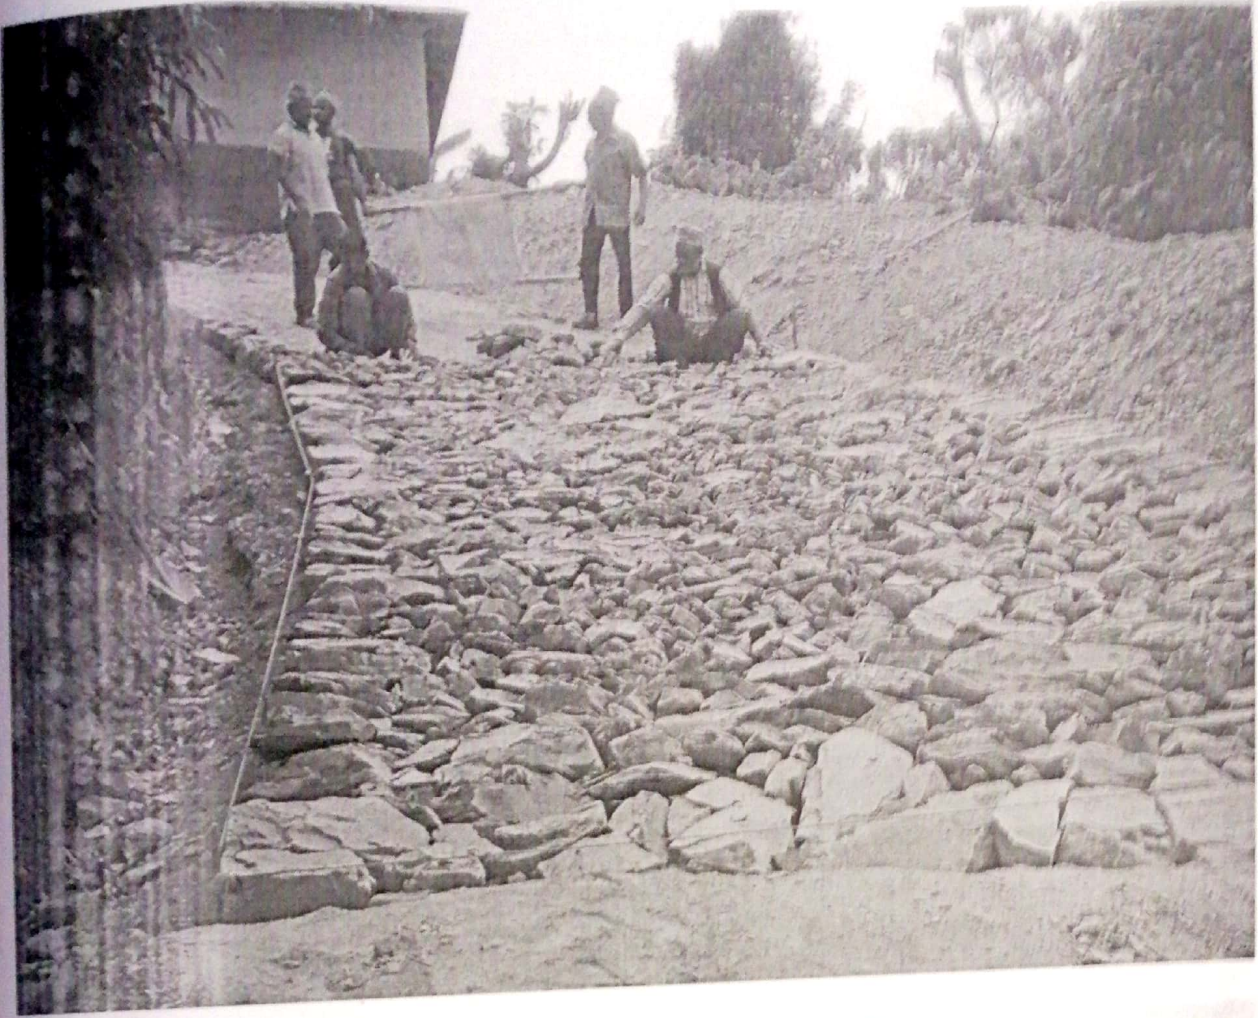



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व.०७७/०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : महेन्द्र विद्याबोध मा.वि विद्यालय सिडि निर्माण
(क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ४
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/०७
- आयोजनाको किसिम :- प्रतिकालय
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- सिडि निर्माण भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- १,४९,९३९/७४
(ग) जनसहभागीता (रकम) :- १५,०३९/७४
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ग) स्थानीय सगको अन्तर्क्रिया : भएको
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : तिलकराम हमाल
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

(ख) स्थान टोल : केरुडा
(घ) सम्मौता मिति :- २०७७/१०/१४

(ख) विनियोजित बजेट :- १,३०,०००/००
(घ) जम्मा लगत :- १,४९,२७९/६२

(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	
५	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
६	श्री हरि प्रसाद खनाल	प्राविधिक	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

महेन्द्र विद्यावोध मा.वि विद्यालय सिडि निर्माण योजना अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व. ०७३०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।



- आयोजनाको नाम : थाम शौचालय र उज्जु खाना निर्माण
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. २
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०२/०४
 - (ख) स्थान टोल : बल्कोट
 - (घ) सम्मौता मिति :- २०७७/०९/०६
- आयोजनाको किसिम :- पौवा निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- शौचालय र उज्जु खाना निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ३,२४,२७९।८५
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ३,००,०००।
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ३२,३३३।८५
 - (घ) जम्मा लागत ३,२४,८२८।५९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरिक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष: बसरथ मियाँ
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल



क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री विशाल ओली	अ.सब ईन्जिनियर	
७	श्री हरि खनाल	प्राविधिक	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

थाम शौचालय र उज्जु खाना निर्माण अनुगमन

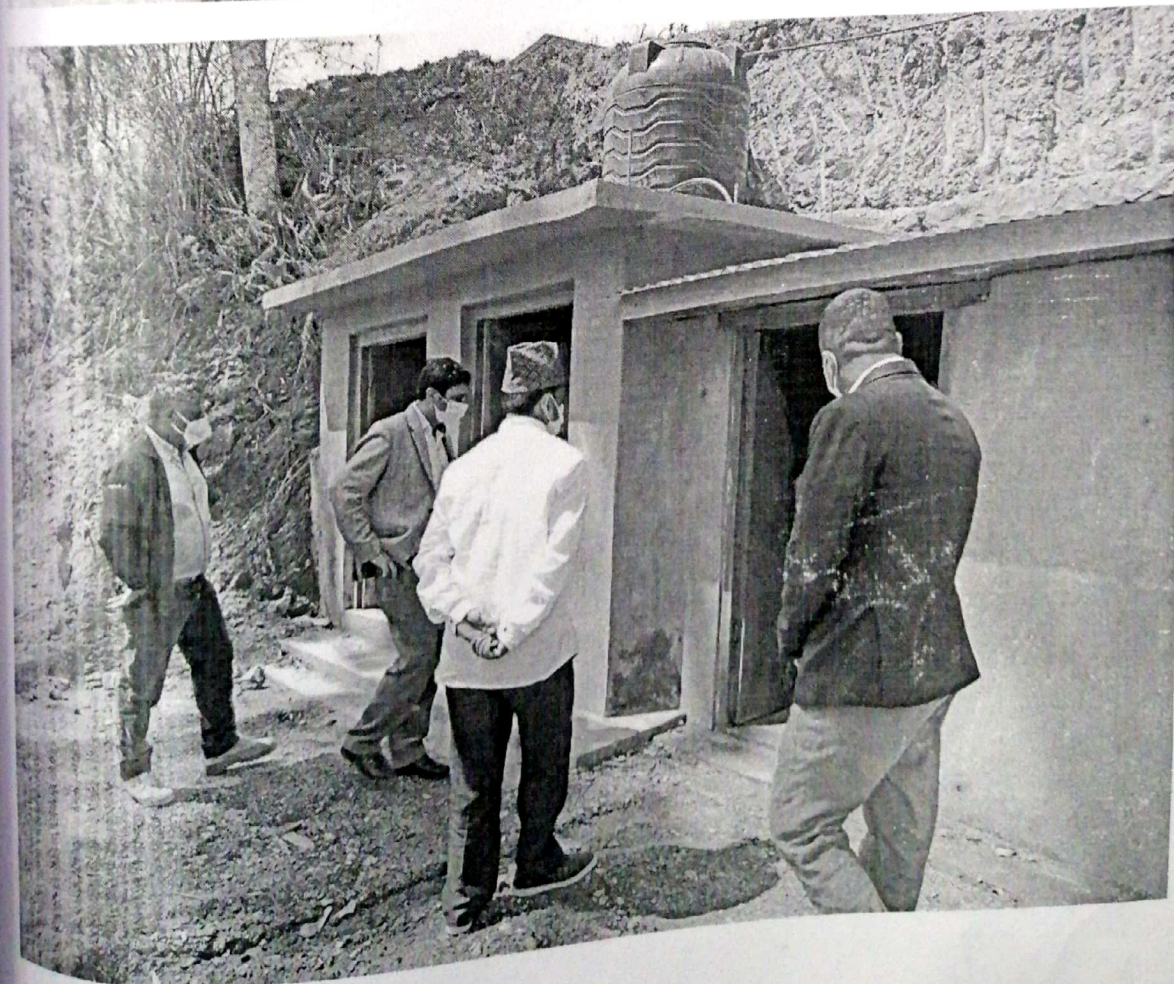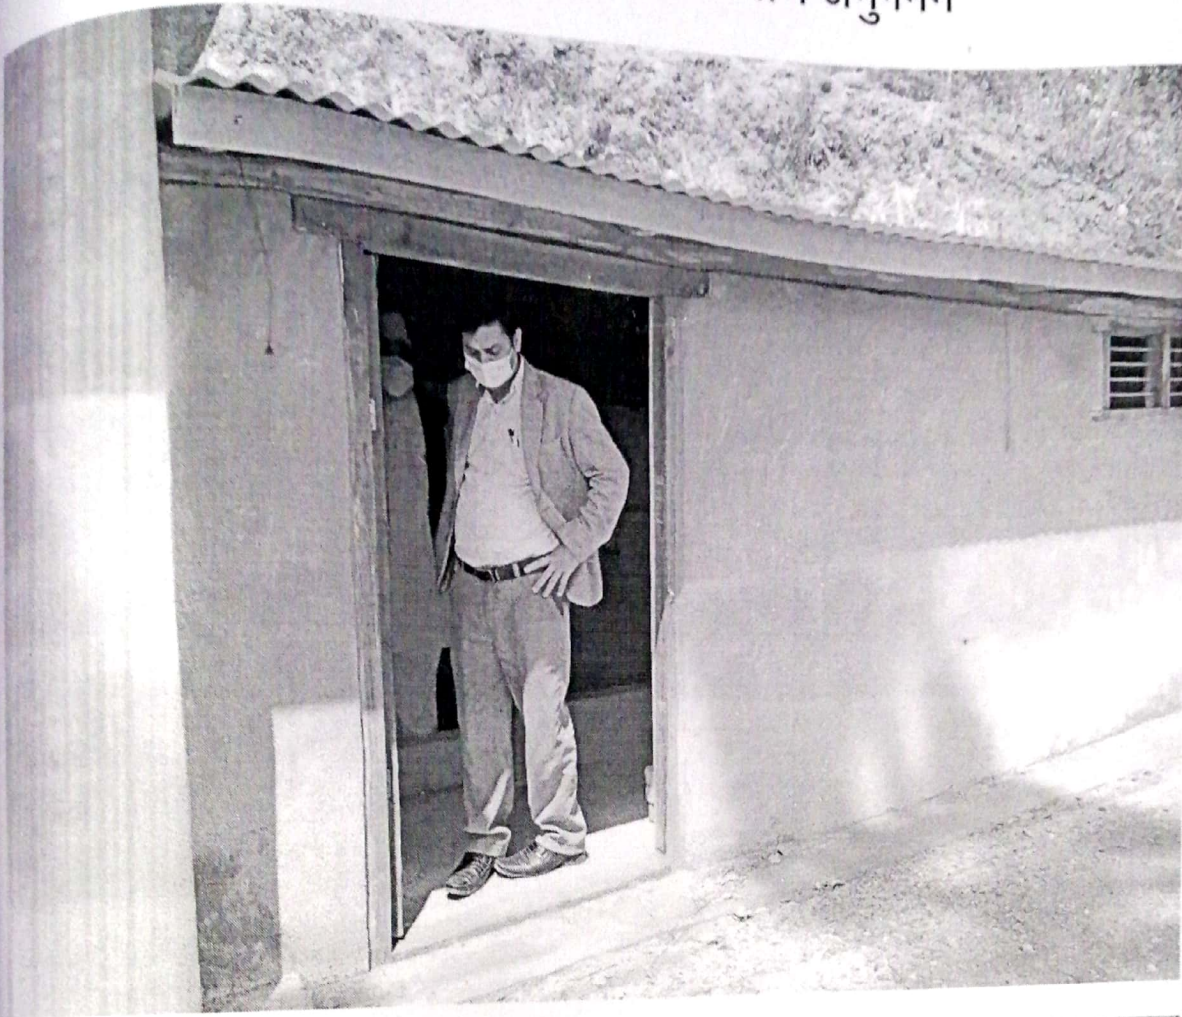

थाम शौचालय र उज्जु खाना निर्माण अनुगमन

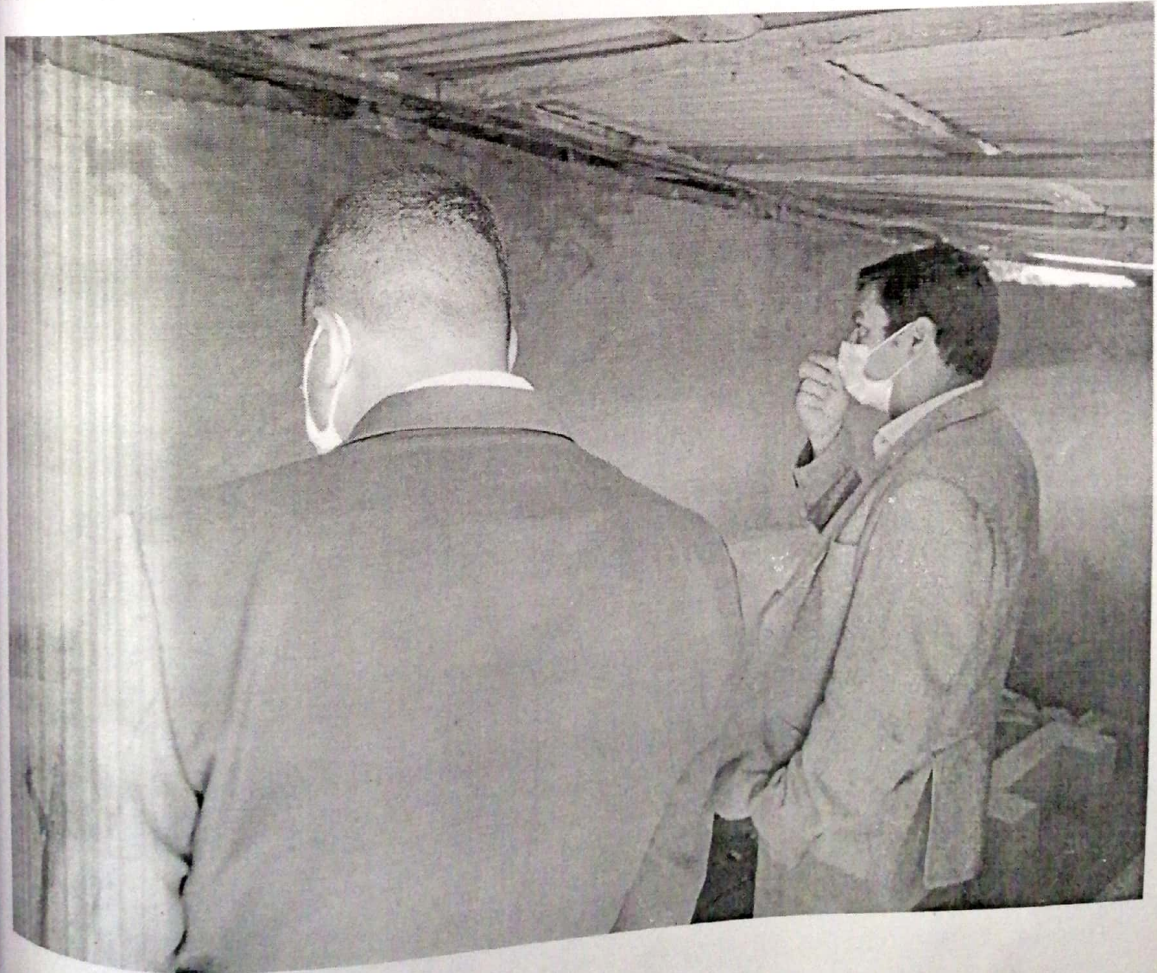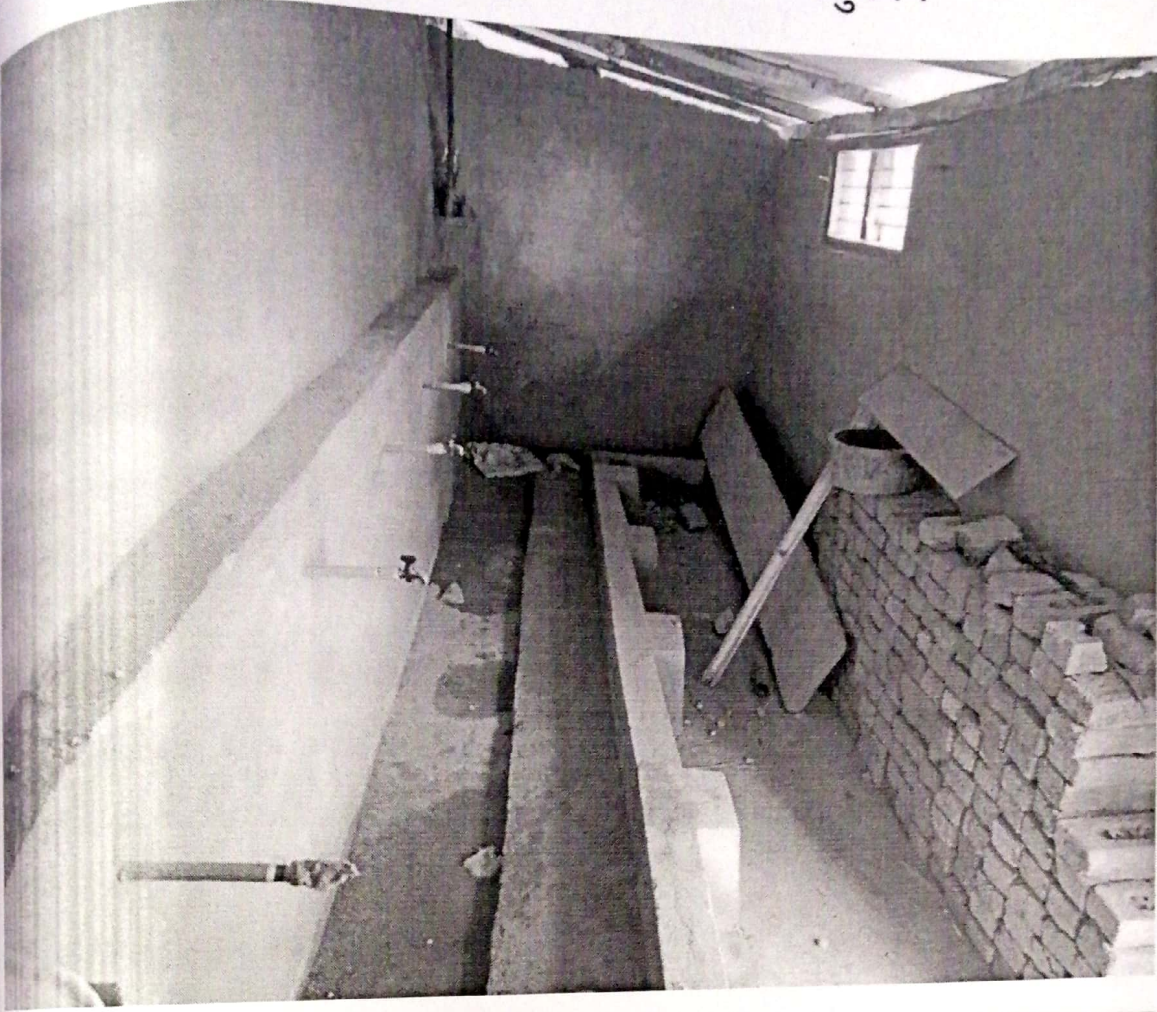



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगाञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.व. ०७३/०७८ मा गा.पा. बाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : **बल्कोट चौपारी निर्माण**
 - (क) आयोजना संचालन हुने बडा नं. २
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०९/३०
 - (ख) स्थान टोल : बल्कोट
 - (घ) सम्मौता मिति :- २०७७/१२/१६
- आयोजनाको किसिम :- पौवा निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- चौपारी निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- १,०९,५८३।५४
 - (ख) विनियोजित बजेट :- १,००,०००।
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- १०,७७७।५४
 - (घ) जम्मा लगत १,०९,६८२।९५
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरिक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : माधव थापा
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेपराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री राजेश कुमार पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री विशाल ओली	अ.सव ईन्जिनियर	
७	श्री हरि खनाल	प्राविधिक	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

बालकोट चौपारी निर्माण अनुगमन





छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रदेव, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

श.स. ०७७०७८ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो।



- आयोजनाको नाम : रिठाका रुख मदन आश्रित स्मृति चौपारी निर्माण छत्रदेव ४
 - (क) आयोजना संचालन हुने बडा नं. ४
 - (ख) स्थान टोल : केरुडा
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०९/२९
 - (घ) सम्मौता मिति :- २०७७/११/१६
- आयोजनाको किसिम :- प्रतिशालय
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- चौपारी निर्माण भएको, नापी किताबमा उल्लेख भएको।
 - (क) लगत अनुमान रकम :- ५,३८८८९/१६
 - (ख) विनियोजित बजेट :- ५,००,०००/००
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- ५३,८८९/१६
 - (घ) जम्मा लागत :- ५,४०,२३५/७९
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार भएको।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेन्ट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : लेखबहादुर सारु मगर
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	
५	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
६	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
७	श्री पार्वती पाण्डे	सब. ईन्जिनियर	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो।

रिठाका रुख मदन आश्रित स्मृति चौपारी निर्माण छत्रदेव ४ अनुगमन

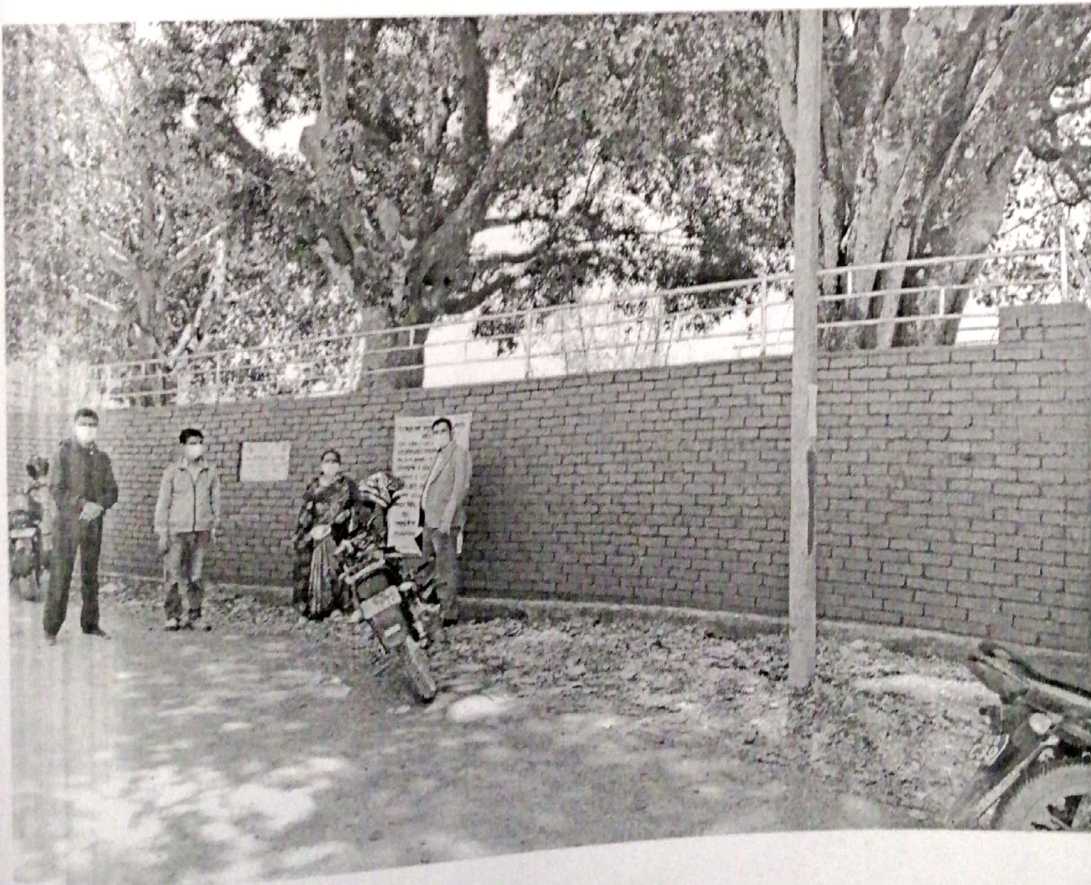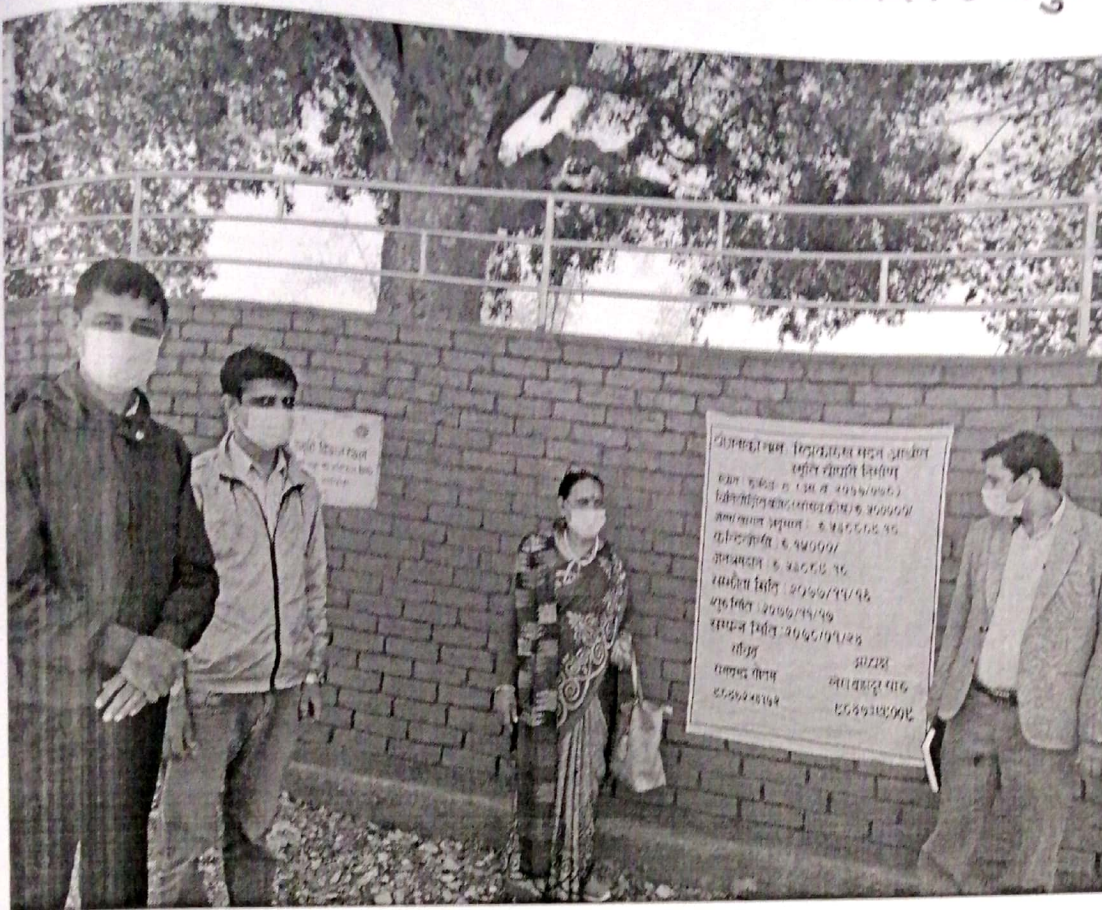



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

आ.ब.०३३०७८ मा संघीय सरकार सशत तर्फ विद्यालय भौतिक पूर्वाधारबाट स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित प्राविधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।


- आयोजनाको नाम : अरटारी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण
 - (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ६
 - (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०१/२६
- आयोजनाको किसिम :- भवन निर्माण
 - (ख) स्थान टोल : ठूलापोखरा
 - (घ) सम्पत्ती मिति :- २०७७/०७/२३
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- अरटारी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण, नापी किताबमा उल्लेख भएको .
 - (क) लगत अनुमान रकम :- १४,४४,९६६।०२
 - (ख) विनियोजित बजेट :- १३,००,०००।००
 - (ग) जनसहभागीता (रकम) :- १,४४,९६६।०२
 - (घ) जम्मा लागत : १४,५०,९३०।७५
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
 - (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
 - (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
 - (ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
 - (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : जगन्नाथ रेग्मी
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री कमल पौडेल	वडा अध्यक्ष	
४	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
५	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६	श्री शंकर रिजाल	सब-ईन्जिनियर	
७	श्री मणीराम विश्वकर्मा	वडा सचिव	

माथि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

अरटारी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण अनुगमन

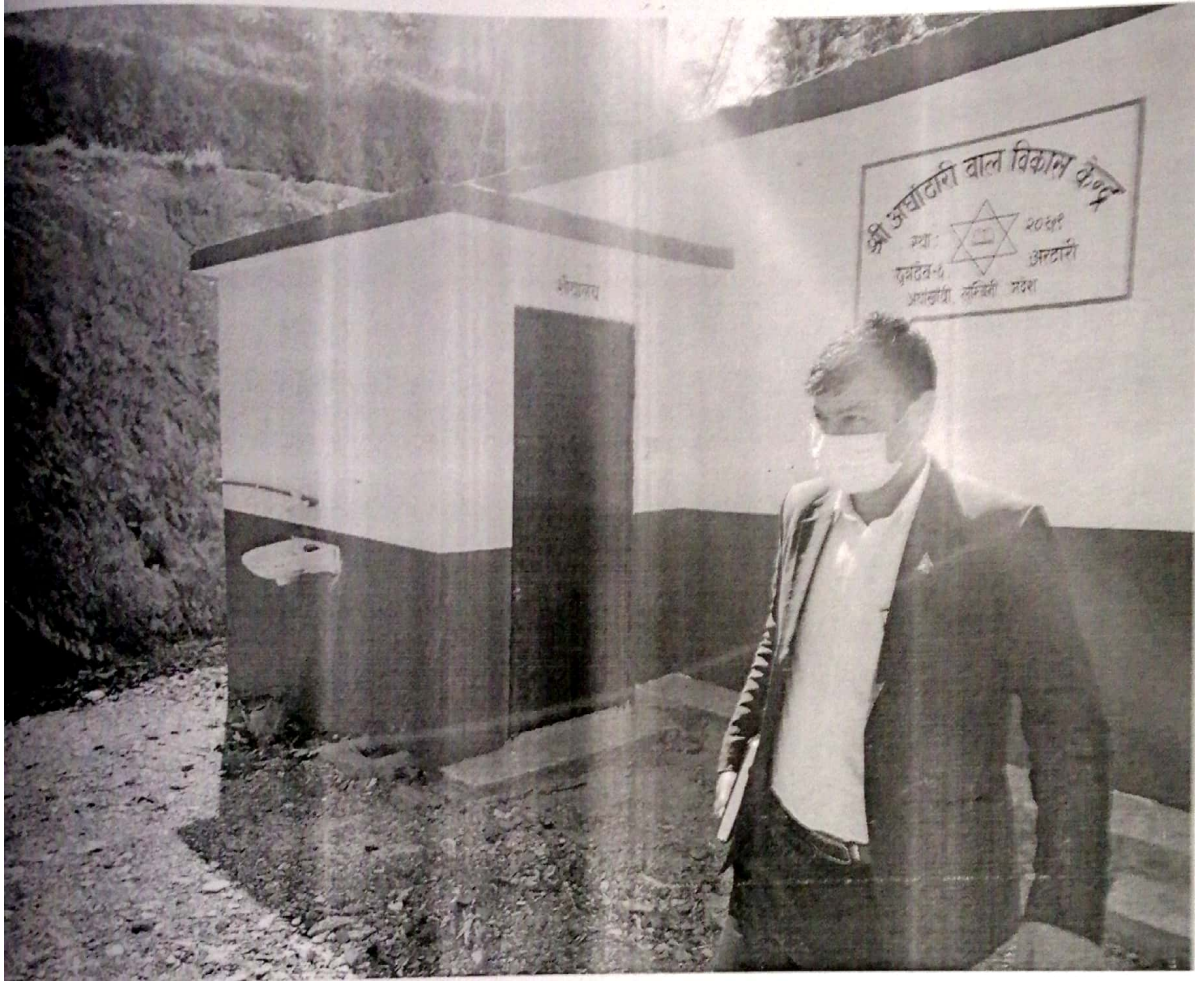



छत्रदेव गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

०७७०७६ मा स्वीकृत कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश



- आयोजनाको नाम : म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजना
- (क) आयोजना संचालन हुने वडा नं. ६
- (ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७६/०९/२५
- आयोजनाको किसिम :- भवन निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भैतिक) योजना :- म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजना, नापी किताबमा उल्लेख भएको.
- (क) लगत अनुमान रकम :- १०,२३,९८०।८५
- (ख) विनियोजित बजेट :- ९,५०,०००।००
- (ग) जनसहभागिता (रकम) :- १,०२,४८०।८५
- (घ) जम्मा लगत : १०,२४,२०८।९५
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
- (क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
- (ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
- (ग) स्थानीय संघको अन्तर्क्रिया : भएको
- (घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने /नगर्ने) :- गर्ने
- अधिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष : राम बहादुर राना
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

तपशिल



स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
	श्री कमल पौडेल	वडा अध्यक्ष	
	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
	श्री शंकर रिजाल	सब-ईन्जिनियर	
	श्री मणीराम विश्वकर्मा	वडा सचिव	

गोप्य उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजना अनुगमन

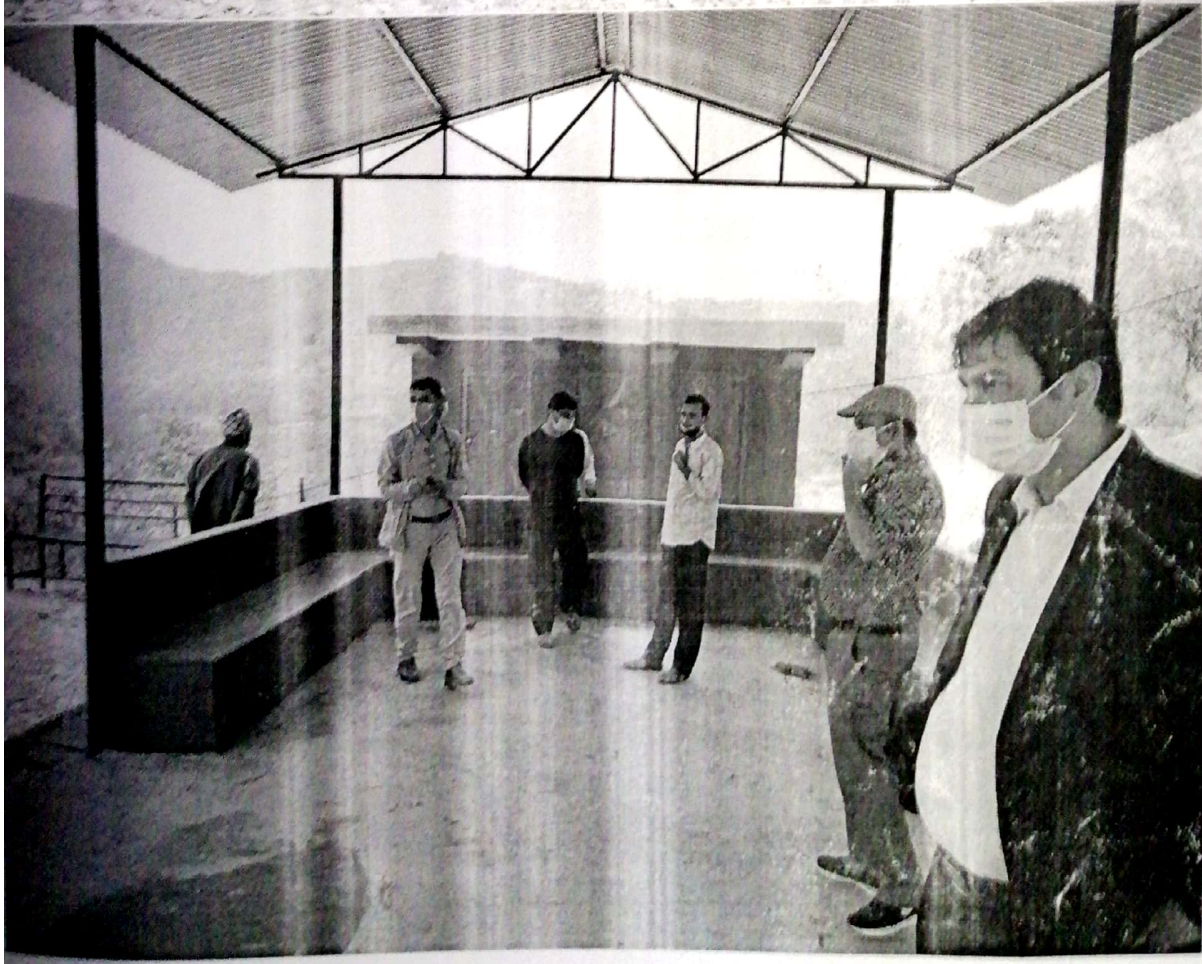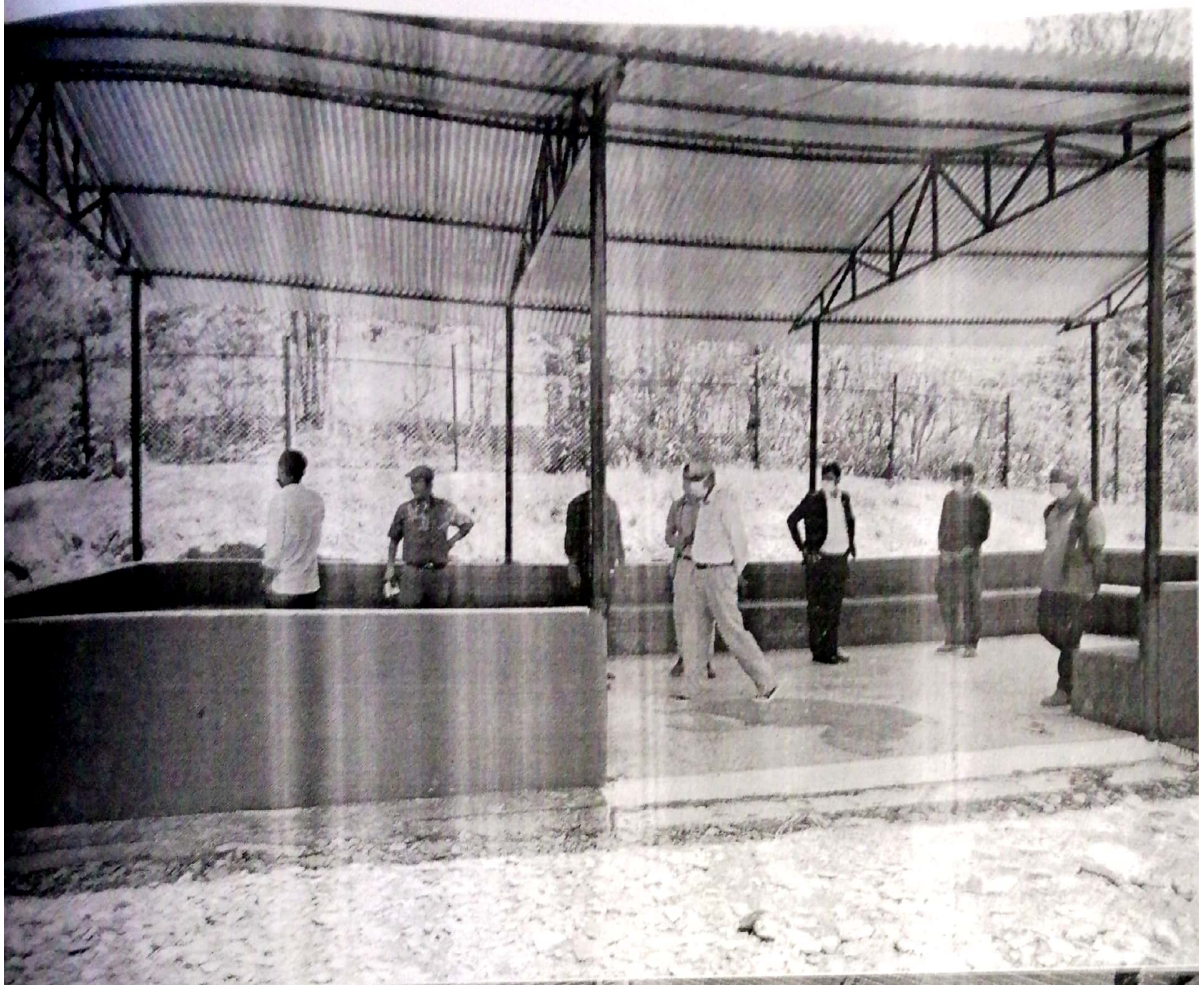

म्यालनेटा बाल उद्यान, निर्माण योजना अनुगमन

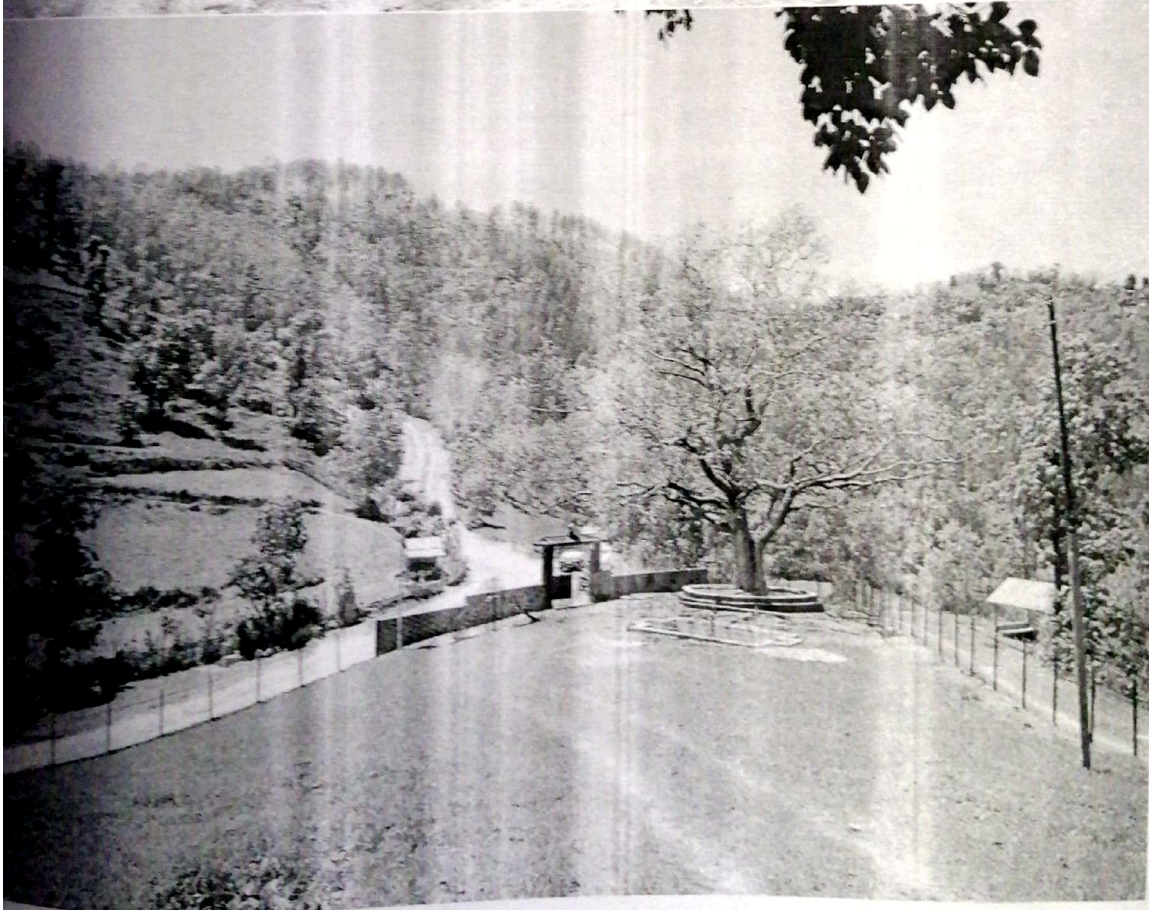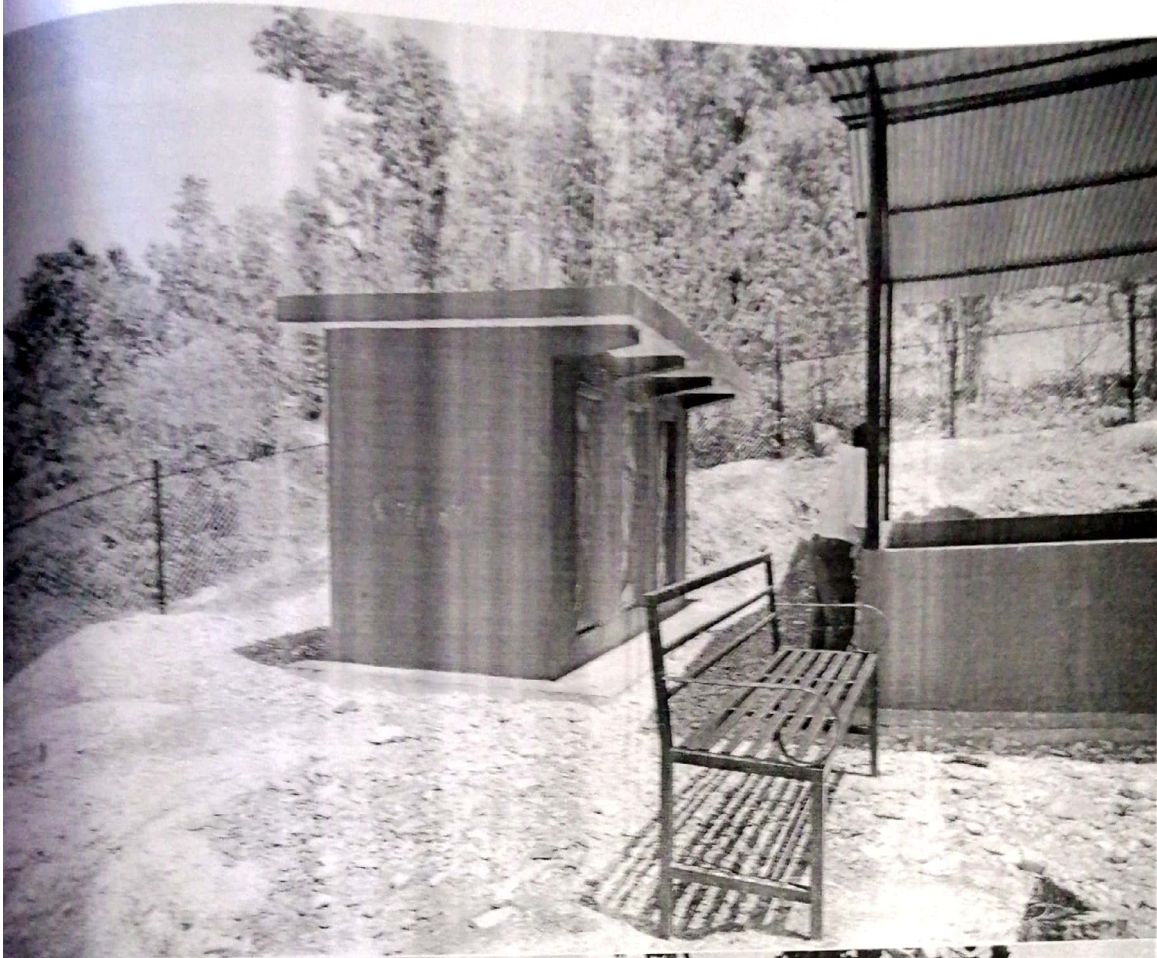



छत्रदेव गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

छत्रगञ्ज, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन

०७७०७८ मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सशर्त कार्यक्रम निम्नानुसारको आयोजनामा तपशिलमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुले स्थलगत गमन गरी प्रतिवेदन पेश गरियो ।

- आयोजनाको नाम : ईदगाहा बाउण्ड्री र मस्जिद भिनारा निर्माण बडा नं. १
(क) आयोजना संचालन हुने बडा नं. १
(ग) अनुगमन गरेको मिति :- २०७८/०१/२१
- आयोजनाको किसिम :- ईदगाहा र मस्जिद निर्माण
- आयोजनाको विवरण (भौतिक) योजना :- ईदगाहा बाउण्ड्री र मस्जिद भिनारा निर्माण कार्य भएको नापी किताबमा उल्लेख भएको ।
(क) लगत अनुमान रकम :- १०,७७,८७८/४३
(ग) जनसहभागिता (रकम) :- १,०७,८७८/४३
- अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण विधि :
(क) स्थलगत निरीक्षण : भएको
(ग) स्थानीय संगको अन्तर्क्रिया : भएको
- अनुगमन गर्दा देखिएको व्यहोरा :- प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार भएको ।
- किटानी सिफारिस (योजना फरफारक गर्ने / नगर्ने) :- गर्ने
- अघिल्लो अनुगमनमा कुनै निर्देशन दिएको भए सो अनुसार कार्य भए नभएको विवरण :- निर्माण कार्य प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- उपभोक्ता समिति अध्यक्ष जहिर मियाँ
- अनुगमन संयोजक :- तुल्सीदेवी श्रेष्ठ

(ख) स्थान टोल चिह्निका
(घ) सम्पत्ती मिति :- २०७७/०७/०५

(ख) विनियोजित बजेट :- १०,००,०००।
(घ) जम्मा लागत : १०,७८,१७४।१८

(ख) प्राविधिक नाप जाँच : भएको
(घ) अन्य (उल्लेख गर्ने) :

तपशिल



क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक	
२	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
५	श्री सुनिल पन्थी	योजना शाखा प्रमुख	
६	श्री किरण तामाङ	अ.सब-इन्जिनियर	
७	श्री नारायण जवाली	वडा सचिव	

यसि उल्लेखित विवरण भएको आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गर्दा ल.ई. अनुसार कार्य सम्पन्न देखिन आएकोले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसारको आयोजनाको भुक्तानी / फरफारक सिफारिश गर्ने निर्णय गरियो ।

इलाहाबादवासी र मस्जिद मिनारा निर्माण वडा नं. १ योजना अनुगमन



ईदगाहा बाउण्ड्री र मस्जिद मिनारा निर्माण वडा नं. १ योजना अनुगमन

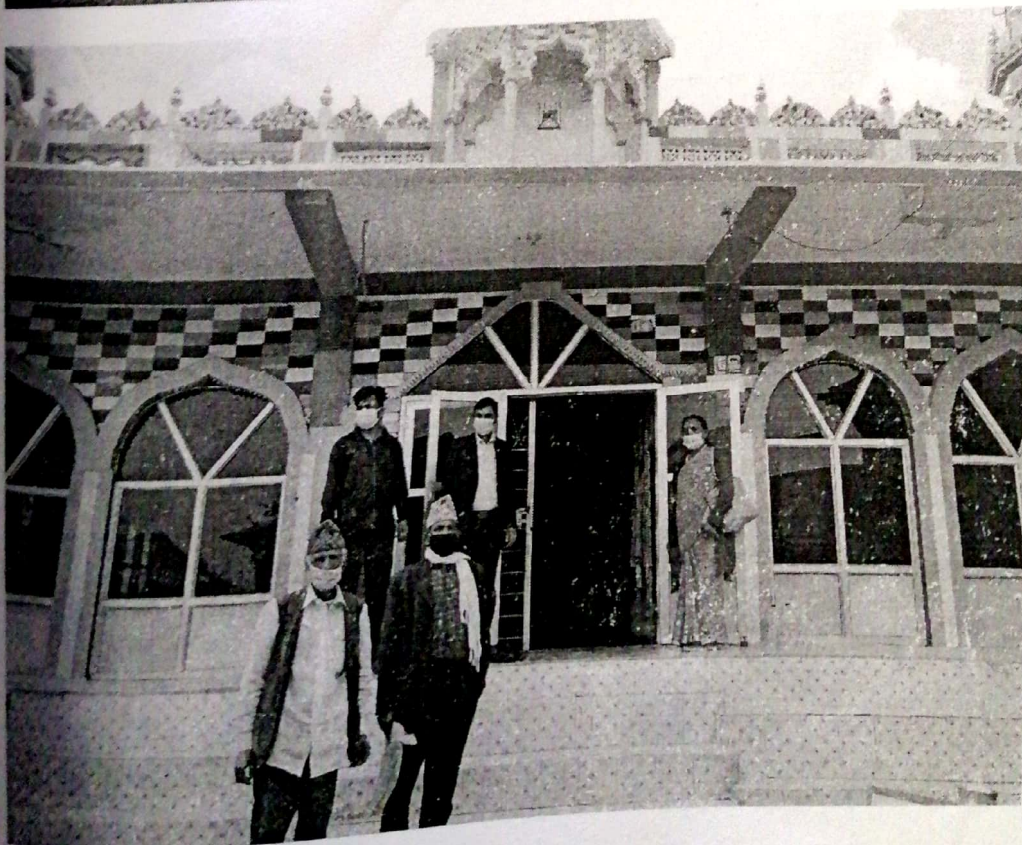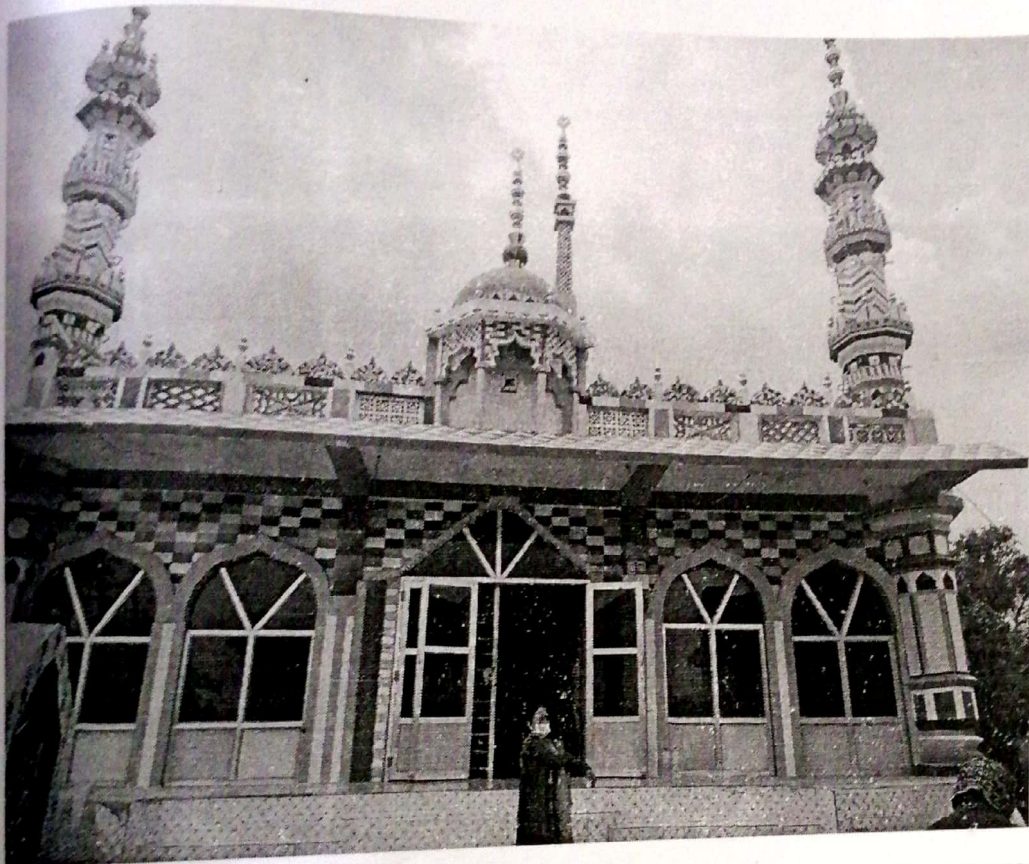

आ.व २०७७/७८ का योजना अनुगमनका तस्विरहरु

